


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-12	공 약 사업명	노단이~광동간 도로 확포장						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	2,500백만 원 (도 2,500)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 창녕읍 옥천리 일원 ○ 사업기간: 2022.~2025. ○ 사업내용: 도로확포장 L=0.98km, B=8.0m 								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
	계	2,500	1,500	2023년	2024년	2025년	2026년		
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	2,500	1,500	1,000	-	-	-	-	
	군비	-	-	-	-	-	-	-	
	민자등	-	-	-	-	-	-	-	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계용역 및 완료 : 2015. 1.~6. ○ 토지보상 협의 등 행정절차 추진 : 2021. 8.~2022. 6. ○ 공사 착공 : 2022. 7. ○ 공사 완료에 따른 도로 임시 개통 : 2023. 12. 								
공약 이행률	90%	2024년 목표		공사 준공					
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미등기 토지(1필지) 소유권 미이전에 따른 경남도 비관리청 공사 준공 지연 ⇒ 경남 지방토지수용위원회 수용 절차를 거쳐 소유권 이전 후 공사 준공처리 하겠음. 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경남 지방토지수용위원회 수용재결 : 2024. 6. ○ 공사 준공 : 2024. 6. 								
주관부서 (팀명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)		

위치도 및 현황사진



위치도

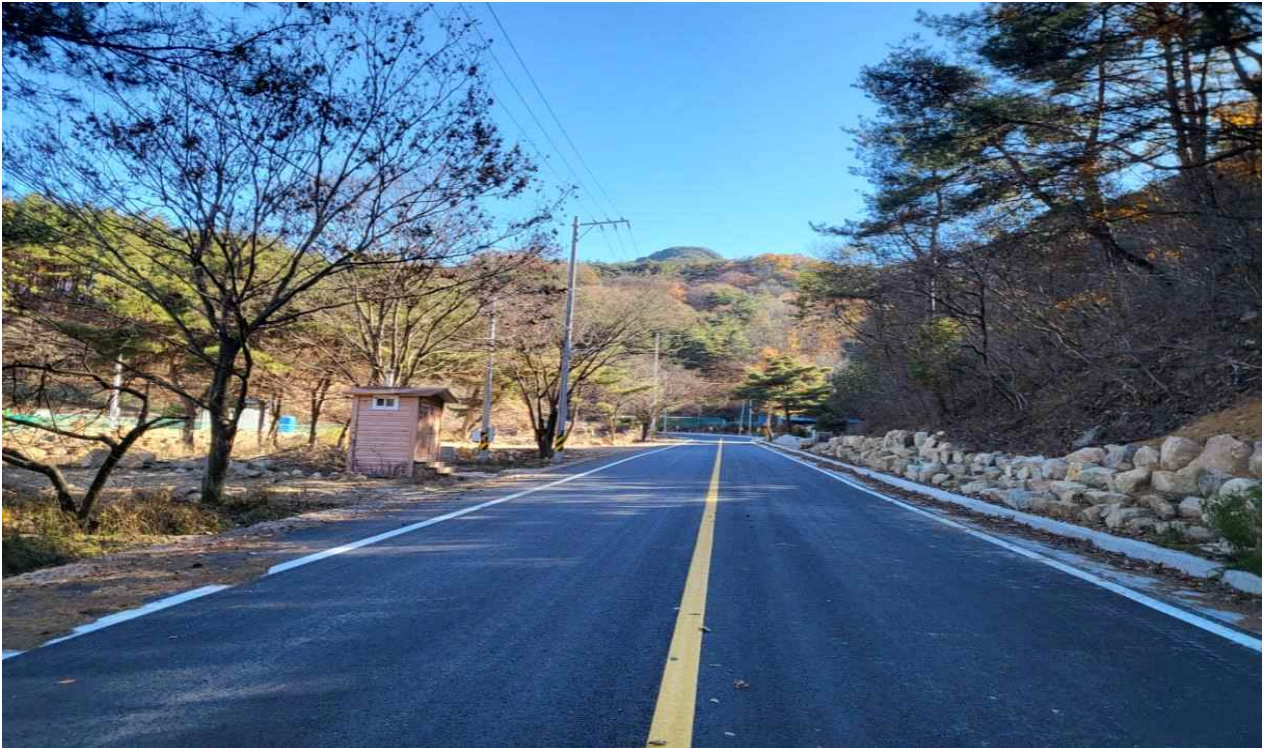

현장사진
