
공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-14	공 사업	보고 보고 국민~원동가 드로 와포장							
사업주체	창녕군	완료시	\7\ °	IJ기내 	공약 이행도					
총사업비		650백 (군 (이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	· 폐기
사업개요	○ 위 치: 부곡면 부곡리 380번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 6.~2024. 12. ○ 사업내용 - 도로확포장 L=340m, B=4.0m									
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분 총 액		기투자	2023년	임기 2024년		내 2025년	2026년		임기후
	 계	650	_	400	250		<u> 2023년</u> -	2020	끄	_
	국 비	_	_	_	_		_	_		_
	도 비	-	-	_	_		-	_		_
	군 비	650	_	400	250	0	-	_		-
	민자 등	-	-	_	_		-	_		-
추진현황	○ 실시설계용역: 2023. 6.~2023. 8.○ 주민설명회 개최: 2023. 8.○ 분할측량 및 편입토지 감정평가 실시: 2024. 1.~2024. 2.○ 공사 착공: 2024. 3.									
공 약 이행률	30%)24년 - 표	보상 완료 및 공사 조기 준공							
문제점 및 대책	O 해당없음.									
향후계획	O 공사 준공 : 2024. 12.									
주관부서 (팀 명)	건설교통 (농업기반탁	구시.	장 입 ^치 (☎1	딘	장		덕환 .752)	담당자		마인택 ▶1754)





위치도

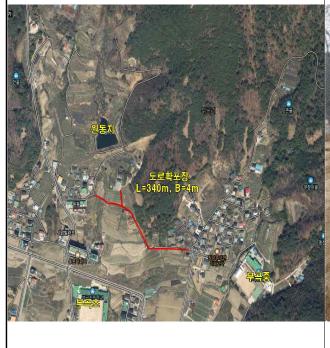

현황사진
