


## □ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

|                   |   |         |             |        |             |       |             |     |    |
|-------------------|---|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-----|----|
| 관리번호              | 3-9   | 공 약 사업명 | 남부권 파크골프장   |        |             |       |             |     |    |
| 사업주체              | 창녕군   | 완료시기    | 임기내         | 공약 이행도 |             |       |             |     |    |
| 총사업비              | 3,500백만 원<br>(균 3,500)  |         |             | 완료     | 이행 후 계속 추진  | 정상 추진 | 일부 추진       | 보류  | 폐기 |
|                   |   |         |             |        |             | ○     |             |     |    |
| 사업개요              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 남지읍 남지리 39번지 일원</li> <li>○ 사업기간: 2023. 6.~2024. 12.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파크골프장조성: 36홀 조성</li> </ul> </li> </ul> |         |             |        |             |       |             |     |    |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분   | 총 액     | 기투자         | 임기내    |             |       |             | 임기후 |    |
|                   |   |         |             | 2023년  | 2024년       | 2025년 | 2026년       |     |    |
|                   | 계   | 3,500   | -           | 100    | 3,400       | -     | -           | -   |    |
|                   | 국 비   | -       | -           | -      | -           | -     | -           | -   |    |
|                   | 도 비   | -       | -           | -      | -           | -     | -           | -   |    |
|                   | 균 비   | 3,500   | -           | 100    | 3,400       | -     | -           | -   |    |
| 민자 등              | -   | -       | -           | -      | -           | -     | -           |     |    |
| 추진현황              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 용역 완료 : 2023. 9.</li> <li>○ 소규모환경영향평가 협의 완료 : 2023. 12.</li> <li>○ 하천점용허가 협의 완료 : 2024. 2.</li> </ul>   |         |             |        |             |       |             |     |    |
| 공 약 이행률           | 40%   |         | 2024년 목표    | 공사 준공  |             |       |             |     |    |
| 문제점 및 대책          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재원 및 행정절차 진행 등 이행상 문제없음.</li> <li>○ 사업계획 상 이상없이 추진 중</li> </ul>  |         |             |        |             |       |             |     |    |
| 향후계획              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 착공: 2024. 3.</li> <li>○ 공사 준공: 2024. 12.</li> </ul>   |         |             |        |             |       |             |     |    |
| 주관부서 (팀 명)        | 관광체육과 (체육지원팀)   | 부서장     | 손전식 (☎1520) | 팀 장    | 유재선 (☎1482) | 담당자   | 김태현 (☎1483) |     |    |

# 위치도 및 현황사진

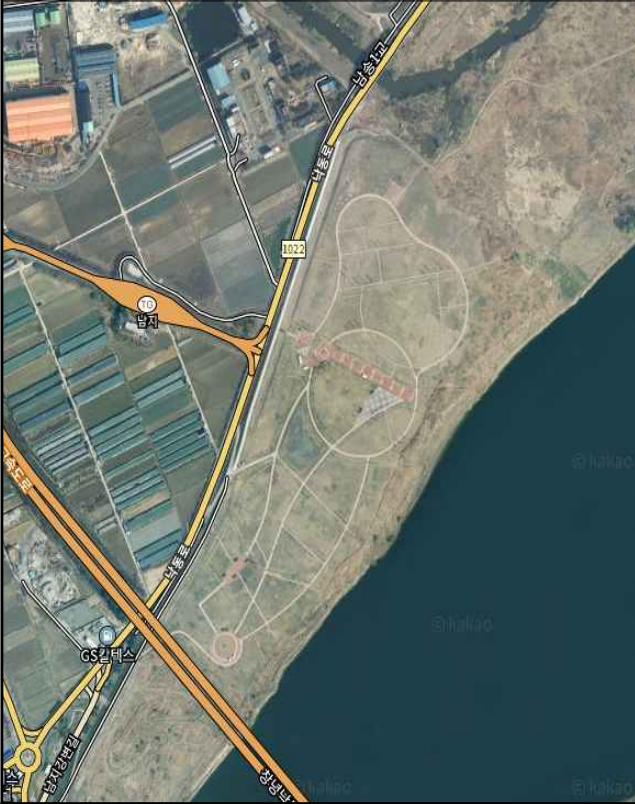

위치도



현황사진
