


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-6	공 약 사업명	이방 석리, 장마 강리지구 농경지 침수피해 개선사업						
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	공약 이행도					
총사업비	6,000백만 원 (도 4,271, 군 1,729)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 이방면 석리, 장마면 강리 일원 ○ 사업기간: 2023. 9.~2027. 12. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모배수장 2개소, 수리시설개보수사업 2식 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	6,000	-	20	1,000	160	2,800	2,020	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	4,271	-	-	-	138	2,408	1,725	
	군 비	1,729	-	20	1,000	22	392	295	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성용역 시행 : 2023. 9.~12. ○ 2024년 상반기 특별교부세 신청(강리지구) : 2024. 3. 								
공 약 이행률	10%	2024년 목표	관련기관 협의 및 배수개선 사업 신청						
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 침수 해소 대책 수립 지연 <ul style="list-style-type: none"> - (석리지구) 침수 해소를 위하여 인근 지방하천 정비 필요 - (강리지구) 농경지가 배수장과 표고 차이가 없어 내수로 인한 침수피해가 발생하며 배수로 확장 및 배수장 증설이 필요함. <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신속한 관련부서 협의 및 해소 방안 모색 <ul style="list-style-type: none"> - (석리지구) 지방하천 정비를 위하여 관련 부서와 지속 협의 - (강리지구) 배수장 증설에는 많은 기간이 소요되므로 우선 원활한 배수를 위하여 유속가속기 설치 및 배수로 정비사업 추진 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 석리지구 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 부서와 지속적으로 협의하겠음 ○ 강리지구 <ul style="list-style-type: none"> - 유속가속기 설치공사 설계용역 : 2024. 7. - 유속가속기 설치공사 시행 : 2025. 1.~12. - 배수장 증설 사업 시행 : 2026. 1.~2027. 12. 								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	차인택 (☎1754)		

위치도 및 현황사진



위치도

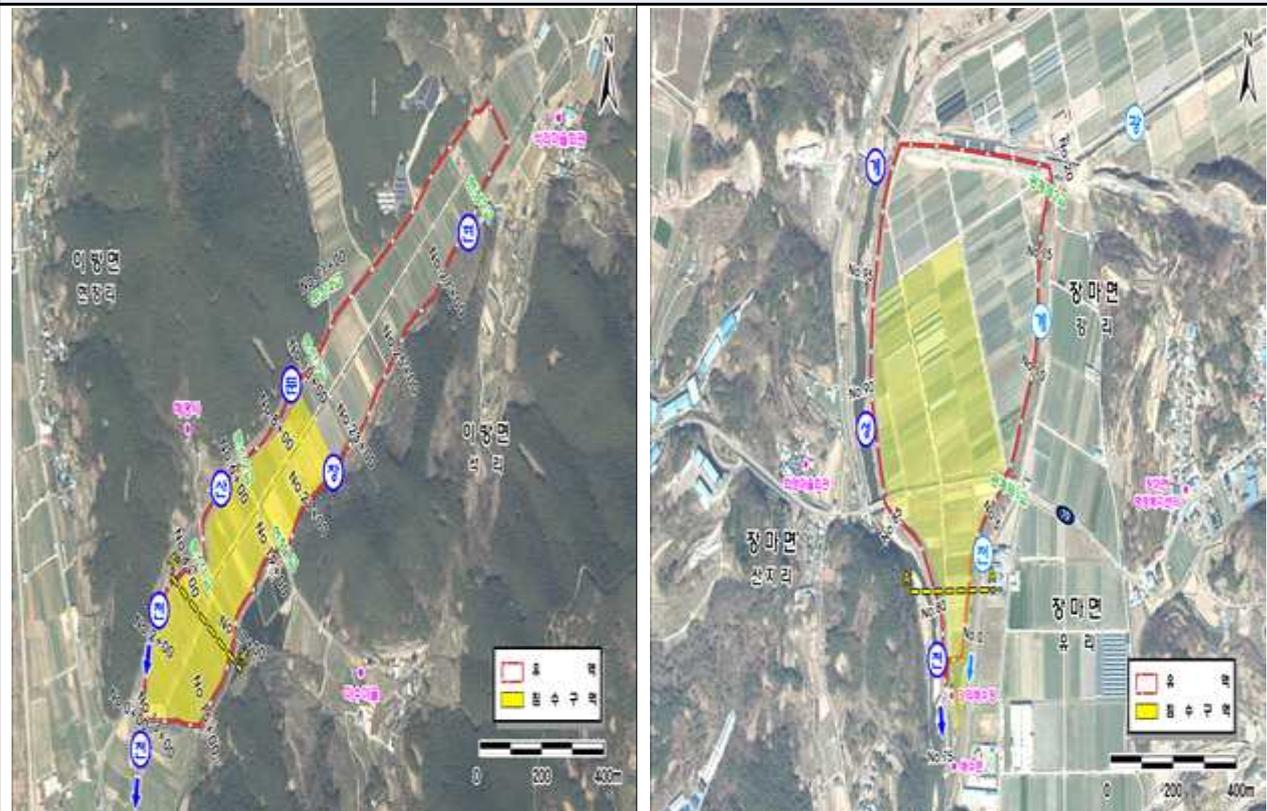

현황 사진(석리지구)

현황 사진(강리지구)
