


## □ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	5-5	공 약 사업명	감동저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	1,600백만 원 (도 1,600)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 창녕읍 하리, 고암면 억만리 일원</li> <li>○ 사업기간: 2022. 5.~2024. 6.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수중펌프 2개소, 용수관로 L=1.2km, 용배수로 L=2.7km</li> </ul> </li> </ul>								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,600	1,600	-	-	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	1,600	1,600	-	-	-	-	-	
	군 비	-	-	-	-	-	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계용역 시행 : 2022. 5.~12.</li> <li>○ 주민설명회 개최 : 2022. 9.</li> <li>○ 경남도 협의 : 2022. 10.~12.</li> <li>○ 공사 착공 : 2023. 3.</li> </ul>								
공 약 이행률	80%	2024년 목표		공사 준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	○ 공사 준공 : 2024. 6.								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	김봉주 (☎1753)		

## 위치도 및 현황사진

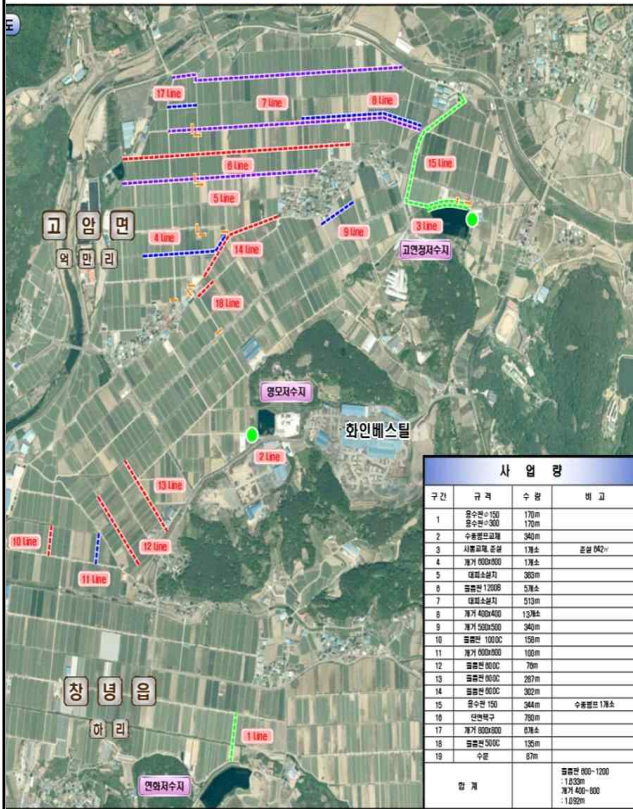

사 업 량			
구간	규격	수량	비고
1	중수관 150	170m	
2	중수관 300	170m	
3	수용량 2000	300m	
4	시공구역 준공	1개소	공법 042
5	대포수설기	300m	
6	공법 1 2000	5개소	
7	대포수설기	510m	
8	대포수설기	1230m	
9	대포수설기	340m	
10	공법 1 1000	150m	
11	대포수설기	150m	
12	공법 1 1000	70m	
13	공법 1 1000	200m	
14	공법 1 1000	300m	
15	중수관 150	544m	수용량 1개소
16	연수관구	700m	
17	대포수설기	6개소	
18	공법 1 1000	120m	
19	수문	67m	
합 계			공법 1 1000 : 1,820m 대포수설기 : 400-400 : 1,820m



위치도

현황사진
