


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-9	공 약 사업명	지방도1034호선 이방 옥야~대합 용산간 도로선형 개선사업					
사업주체	경남도	완료시기	임기후	공약 이행도				
총사업비	5,000백만 원 (도 5,000)		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 이방면 거남리~대합면 내율리 일원 ○ 사업기간: 2026.~2030. ○ 사업내용: 도로 선형개선 L=6.0km(6개소) 							
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후
				2023년	2024년	2025년	2026년	
	계	5,000	-	-	-	-	300	4,700
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	5,000	-	-	-	-	300	4,700
	군비	-	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방도1034호선 도로 선형개선 건의 : 2022. 8. ○ 지방도1034호선(구미·대곡지구) 도로 선형개선 건의 : 2023. 6. 21. ○ 2026~2030 경상남도 도로건설관리계획 수립용역 설명회 참석: 2024. 2. 28. 							
공약 이행률	10%	2024년 목표		경남 도로건설 관리계획 반영				
문제점 및 대책	○ 해당없음.							
향후계획	○ 2026~2030 경상남도 도로건설 관리계획 반영 자료 제출 : 2024. 3월 말							
주관부서 (팀명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	

위치도 및 현황사진

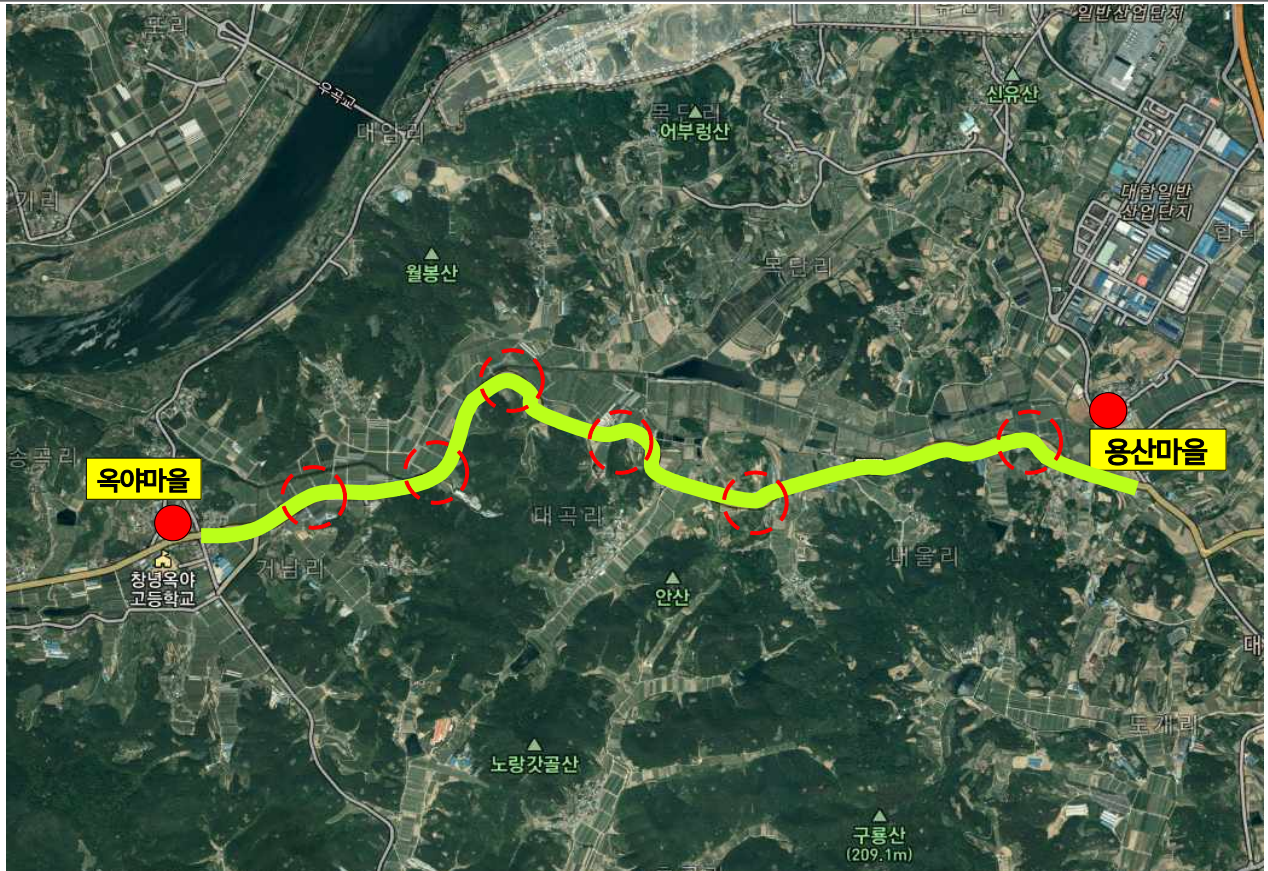

위치도



현황사진
