


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-1	공약사업명	영산 연지 스마트공원 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	3,000백만원 (도 1,300, 군 1,200, 대응기금 500)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 영산면 서리 139-3번지 일원 ○ 사업기간: 2024년~2025년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 노후시설(산책로, 화장실, 공연장, 수질정화시설 등) 리모델링, 포토존 조성 - 스마트시설물, 인공섬 연결다리, 야간경관조명, 미디어아트 등 설치 								
연도별 소요예산 (백만원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	3,000	-	-	2,000	1,000	-	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	1,300	-	-	1,300	-	-	-	
	군비	1,200	-	-	700	500	-	-	
대응기금	500	-	-	-	500	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광자원개발사업 공모 선정 : 2023. 11. ○ 설계용역 발주 : 2024. 2. ○ 지방소멸대응기금(기초) 투자제안 : 2024. 2. 								
공약이행률	5%	2024년 목표		사전절차 이행 및 설계용역 완료					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의견 청취 및 사전절차 이행 등 : 2024. 7. ○ 공사 착공 : 2024. 9. ○ 공사 준공 : 2025. 12. 								
주관부서 (팀명)	산림녹지과 (공원팀)	부서장	박남규 (☎1670)	팀장	공규섭 (☎1662)	담당자	서원우 (☎1664)		

위치도 및 현황사진

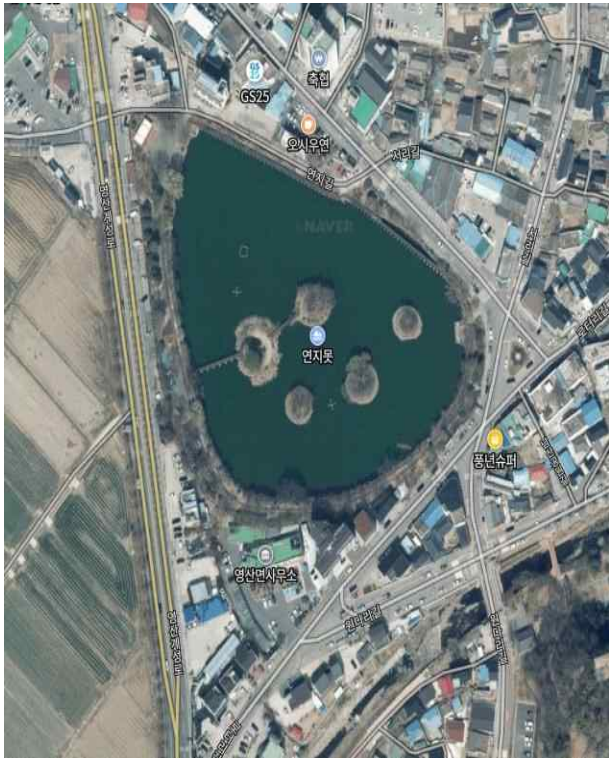

위치도



현황사진
