


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-2	공 약 사업명	달창저수지 수변공원 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,600백만 원 (국 2,800, 도 840, 군 1,960)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 성산면 후천리(정녕리, 냉천리) 일원 ○ 사업기간: 2023~2026년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로 확 · 포장 L=320.0m, 주차장 조성 A=2,660㎡ - 들레길 조성 L=1.5km, 산책로 조성 L=3.13km 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				암기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,600	-	2,000	-	3,600	-	-	
	국 비	2,800	-	1,000	-	1,800	-	-	
	도 비	840	-	300	-	540	-	-	
	군 비	1,960	-	700	-	1,260	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 용역 완료 : 2020. 6. ○ 소규모환경영향평가 용역 완료 : 2021. 6. ○ 군계획시설결정 용역 완료 : 2021. 12. ○ 1단계 사업 착공 : 2022. 11. 								
공 약 이행률	50%		2024년 목표	2024. 6. 준공					
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2단계사업 농업진흥구역 해제 및 용도변경 추진이 어려움. <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 군에서 허가할 수 있는 개발행위 가능한 사업으로 변경 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1단계 사업 준공: 2024. 6. 								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (관광체육시설팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	한형돈 (☎1542)	담당자	이승엽 (☎1544)		

위치도 및 현황사진

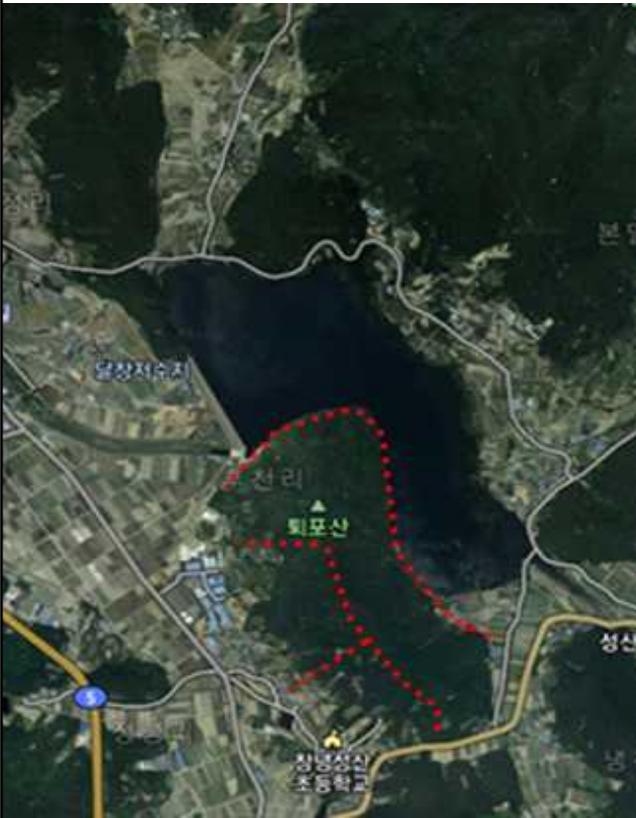

위치도



현황사진
