


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-7	공 약 사업명	대지면 토평천 수변 들레길 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	1,000백만 원 (군비 1,000)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 대지면 왕산리(만촌교)~효정리(창산교) ○ 사업기간: 2024년~2026년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 들레길 조성 L=7.0km, 쉼터조성 등 편의시설 1식 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,000	-	-	50	100	850	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	1,000	-	-	50	100	850	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하천기본계획 용역착수(낙동강유역환경청) ○ 사업구간 친수지구 지정건의 ○ 사업구간 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면 왕산리(만촌교)~효정리(창산교) 								
공 약 이행률	20%	2024년 목표		기본계획용역					
문제점 및 대책	<p>【문제점 및 대책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정상추진 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획용역 : 2024. 3.~12. ○ 기본 및 실시설계용역 : 2025. 1.~6. ○ 하천점용 협의(경상남도) : 2025. 4. ○ 공사 착공 및 준공 : 2025. 7.~2026. 12. 								
주관부서 (팀 명)	하천팀	부서장	하일문 (☎1800)	팀 장	이철희 (☎1812)	담당자	조용곤 (☎1813)		

위치도 및 현황사진

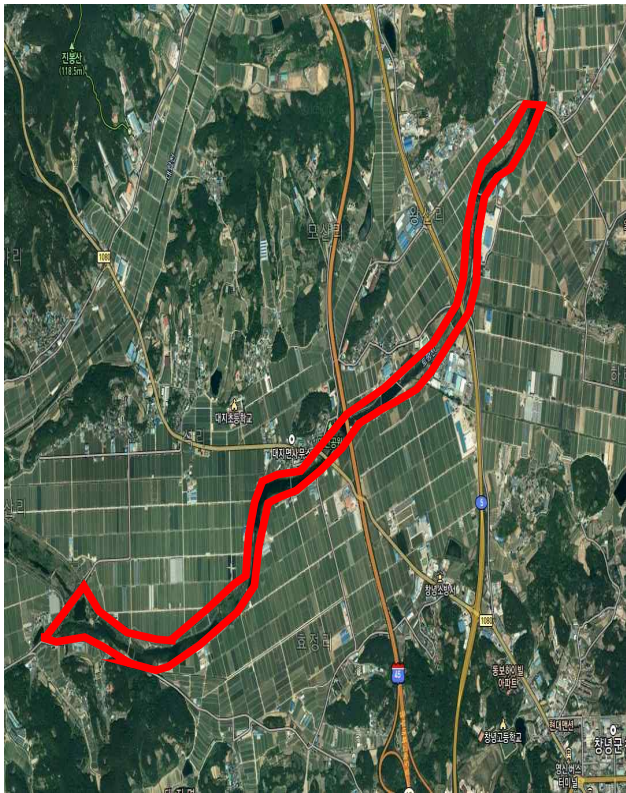

위치도



현황사진(대지면 왕산리 만촌교 일원)
